Id	Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1		**1 Planning algemeen**	**356 dagen?**	**din 21-3-17**	**woe 31-10-18**
2		**1.1 Bestuurlijk traject**	**107 dagen**	**din 21-3-17**	**don 21-9-17**
7		**1.2 Projectvoorbereiding**	**0 dagen**	**woe 22-3-17**	**woe 22-3-17**
9		**1.3 Projectspecifiek Programma van eisen Openbaar gebied**	**63 dagen**	**woe 22-3-17**	**vri 23-6-17**
23		**1.4 Voorlopig ontwerp**	**97 dagen**	**din 16-5-17**	**don 26-10-17**
42		**1.5 Definitief ontwerp**	**135 dagen**	**din 16-5-17**	**din 9-1-18**
61		**1.6 Verkenning Diensten en bedrijven VO**	**45 dagen**	**woe 25-10-17**	**din 16-1-18**
69		**1.7 Bestek en aanbesteding**	**203 dagen?**	**din 16-5-17**	**vri 13-4-18**
81		**1.8 Aanbesteding**	**32 dagen**	**maa 19-3-18**	**din 8-5-18**
92		**1.9 Voorbereiding uitvoering**	**15 dagen?**	**maa 2-4-18**	**vri 20-4-18**
96		**1.10 Oplevering huis van Leusden**	**92 dagen**	**maa 28-5-18**	**woe 31-10-18**
99		**1.11 Uitvoering**	**257 dagen?**	**maa 12-6-17**	**din 28-8-18**
108		**1.12 Inspraak**	**70 dagen?**	**woe 25-10-17**	**din 20-2-18**
120		**1.13 Onderzoeken**	**36 dagen**	**don 15-6-17**	**don 31-8-17**
125		**1.14 Vergunningen**	**95 dagen**	**woe 13-12-17**	**din 22-5-18**
135		**1.15 Verkeersbesluit**	**70 dagen**	**din 12-12-17**	**din 10-4-18**

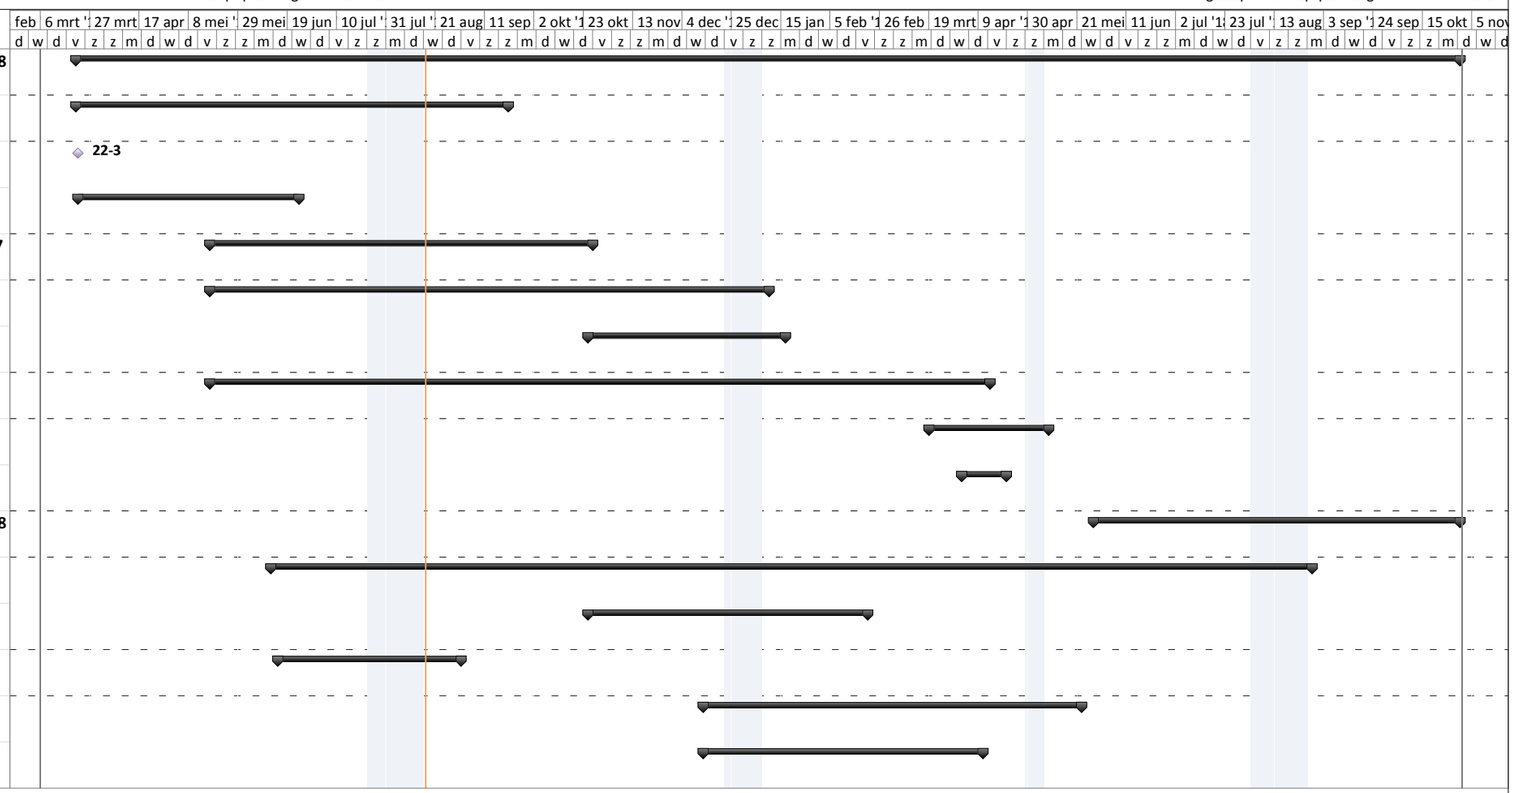

Project: ingeklapte Conceptplann
Datum: don 17-8-17

Taak	Samenvatting	Externe mijlpaal	Inactieve samenvatting	Handmatige samenvatting	Alleen einddatum	Kritieke splitsing
Splitsing	Projectsamenvatting	Inactieve taken	Handmatig taak	Handmatige samenvatting	Deadline	Voortgang
Mijlpaal	Externe taken	Inactieve mijlpaal	Alleen duur	Alleen begindatum	Kritiek	
